

BILAN

de la CHARTE FORESTIERE 2011-2013

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin



0. PREAMBULE	4
I. BILAN DE L'ENJEU I	5
I.1. Bilan général de l'enjeu I	5
I.2. Bilan détaillé de l'enjeu I par actions	6
Action I.1. Améliorer l'utilisation et l'entretien des voiries forestières	6
Action I.2. Proposer des alternatives d'organisation et de gestion forestière à l'interface voirie/forêt	7
Action I.3. Rencontrer les entreprises de travaux forestiers	8
Action I.4. Proposer des formations aux entreprises de travaux forestiers	9
Action I.5. Mettre en place une gestion forestière durable prenant en compte les enjeux ornithologiques sur un secteur expérimental	10
II. BILAN DE L'ENJEU II	12
II.1. Bilan général de l'enjeu II	12
II.2. Bilan détaillé de l'enjeu II par actions	13
Action II.1. Faire émerger des initiatives collectives au sein des petites entreprises de la filière bois	13
Action II.2. Communiquer sur les entreprises et leur savoir faire	13
Action II.3. Marquer « Parc » des produits et savoir-faire bois	14
Action II.4. Inciter à la création d'une gamme de mobilier en essences locales	14
Action II.6. Lancer un appel à projet pour l'extension bois de bâtis anciens communaux	15
Action II.7. Sensibiliser à l'utilisation du bois dans la construction	16
III. BILAN DE L'ENJEU III	17
III.1. Bilan général de l'enjeu III	17
III.2. Bilan détaillé de l'enjeu III par actions	17
Action III.1. Accentuer la communication auprès des élus	17
Action III.2. Réaliser un « Plan d'Approvisionnement Territorial » à l'échelle du PNR	18
IV. BILAN DE L'ENJEU IV	19
IV.1. Bilan général de l'enjeu IV	19
IV.2. Bilan détaillé de l'enjeu IV	20
Action IV.1. Renouveler les peuplements et maintenir le potentiel de production	20
Action IV.2. Développer des alternatives de gestion forestière	20
Action IV.3. Accompagner l'exploitation et la gestion forestière le long de cours d'eau	21
Action IV.4. Accompagner le franchissement de cours d'eau	22
Action IV.5. « Sylviculture et changements climatiques » : non programmée	22
Action IV.6. Mettre en place un outil d'aide à la décision pour tendre à l'équilibre sylvo-cynégétique : non programmée	22
Action IV.7. Réaliser des aménagements sur les forêts à forte valeur patrimoniale	23
V. BILAN DE L'ENJEU V	26
V.1. Bilan général de l'enjeu V	26
V.2. Bilan détaillé de l'enjeu V par actions	27
Action V.1. Mettre en place un programme de formation pluri-annuel sur la forêt	27

Action V.2. Animer et mettre en œuvre la Charte forestière de territoire	28
VI. INDICATEURS DE SUIVI GLOBAL DE LA CHARTE	29
VI.1. Nature et volume des aides engagées.....	29
VI.2. Volume d'actions engagées suivant la nature du maître d'ouvrage	29
VI.3. Volume d'actions engagées par enjeu	30
VI.6. Répartition de l'animation par enjeu (2011 -2012).....	31
VI.7. Synthèse des enveloppes	32
VI.8. Participation au comité de pilotage	32

0. Préambule

L'animation de la charte forestière a débuté en 2011.

Le bilan de la charte forestière de territoire se veut volontairement succinct pour permettre une vision la plus objective et globale des actions conduites.

Pour ce faire, un bilan général a été réalisé pour chaque enjeu correspondant respectivement aux parties I-II-III-IV-V. 3 types d'indicateurs ont été utilisés, on parlera :

- d'impacts, concernant les enjeux
- de résultats concernant les objectifs
- de réalisations concernant les actions.


Ils seront appréciés selon 3 niveaux (bon, partiel, faible) établis selon la portée constatée, la réalisation effective, le volume d'enveloppe engagé...des actions.

Et enfin, certains indicateurs de suivi global de la charte ont été examinés (partie IV).

I. Bilan de l'enjeu I

I.1. Bilan général de l'enjeu I

	Impact	Résultat	Réalisation
ENJEU I - MOBILISER DURABLEMENT NOTRE RESSOURCE FORESTIERE	Partiel		
OBJECTIF 1 – Pour une desserte forestière performante, pérenne et intégrée au paysage		Partiel	
Action I.1. Améliorer l'utilisation et l'entretien des voiries forestières			Partielle
Action I.2. Proposer des alternatives d'organisation et de gestion forestière à l'interface voirie/forêt			Partielle
OBJECTIF 2 – Accompagner les entreprises de travaux forestiers		Faible	
Action I.3. Rencontrer les entreprises de travaux forestiers			Partielle
Action I.4. Proposer des formations aux entreprises de travaux forestiers			Bonne
OBJECTIF 3 – Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts		Partiel	
Action I.5. Mettre en place une gestion forestière durable prenant en compte les enjeux ornithologiques sur un secteur expérimental			Bonne

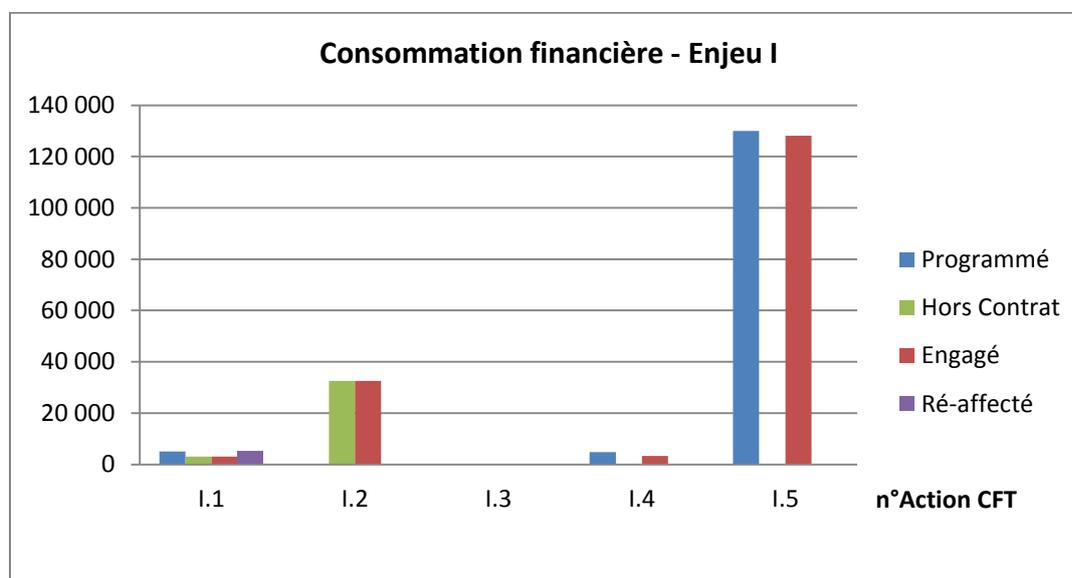

	2011	2012	2013
Animation prévue dans la CFT	27%	18%	19%
Animation effectuée	12%	10%	9%

I.2. Bilan détaillé de l'enjeu I par actions

OBJECTIF 1 – Pour une desserte forestière performante, pérenne et intégrée au paysage

Action I.1. Améliorer l'utilisation et l'entretien des voiries forestières

Réalisations :

Sensibilisation des usagers de la voirie

- organisation de journées de sensibilisation auprès des élus
 - o en partenariat avec l'URCOFOR, le Pays de Guéret, la DRAAF, la DDT19 et 23 et la CFBL. Cette action a été réalisée le 03.10.12 à Feniers.
 - o en partenariat avec la communauté de communes de Bourgneuf-Royère et l'URCOFOR (02.07.13) à Royère-de-Vassivière
- supports de sensibilisation distribués à l'occasion de journées (mode opératoire du Pays de Guéret, articles issus de la voirie routière et code rural, documents officiels - arrêté de permission de voirie)

Extension de la forêt publique

- note d'intention des PNR du Limousin sur l'importance de l'extension des forêts publiques en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin en date du 28.11.2011

Indicateurs de résultats :

- réalisation d'une journée sur la voirie : 30 participants dont 16 élus
- réalisation d'une journée sur la voirie : 56 participants dont 19 élus
- distribution des documents relatifs au mode opératoire de Guéret aux élus présents
- évolution des aides à l'acquisition par les collectivités **en attente**

Réalisations de partenaires en lien avec les objectifs :

- mise en place du mode opératoire du Pays de Guéret sur la communauté de communes de Bourgneuf-Royère (via son PDM, 5 communes sont situées sur le PNR) piloté par la communauté de communes
- réalisation de TRANSBOIS Corrèze pilotée par la DDT19
- préparation de TRANSBOIS Creuse pilotée par la DDT23

Bilan et perspectives :

La communauté de communes de Bourgneuf-Royère est pilote sur le territoire du PNR concernant le thème de la voirie avec la mise en place du mode opératoire du Pays de Guéret.

Les évolutions, durant l'animation de la CFT 2011-2013, nous ont amené à laisser de côté la mise en place du mode opératoire initialement prévu. En effet, l'arrivée de TRANSBOIS 19 et bientôt TRANSBOIS 23 et 87 répond en grande partie aux problématiques de voirie. Il semble plus pertinent d'intégrer la démarche du Pays de Guéret au sein de TRANSBOIS.

Action CFT	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Diffusion mode opératoire du Pays de Guéret	PNR	abandon	5000 €	0 €	50 % Région 50 % PNRML
Journées de sensibilisation « voirie »	URCOFOR	Réalisé	0	3 000 €	50% FEADER 50% URCOFOR

L'accompagnement grâce à l'animation par un technicien auprès des élus reste nécessaire dans cette démarche (état des lieux avant exploitation, étude de l'itinéraire, réception de chantier, dépôt de bois...). La communauté de communes de Bourgneuf-Royère a d'ores et déjà mise en place d'une telle animation depuis aout 2013.



Sortie sur la Neuvielle à Gentioux

Programme d'invitation des élus

[Action I.2. Proposer des alternatives d'organisation et de gestion forestière à l'interface voirie/forêt](#)

Réalisations :

- mise en place d'une démarche collective sur le secteur Nord-Corrézien du PNR avec le CG19 :
 - o marquage conservatoire réalisé par le PNR sur le tronçon Gourdon-Murat/Lestard
 - o analyse des enjeux environnementaux et paysagers globaux sur 11 tronçons départementaux répartis sur les cantons de Meymac, Egletons et Sornac
 - o réalisation d'une analyse paysagère (PNR) et forestière (Chambre d'agriculture 19) sur les 2 itinéraires sélectionnés par le département en 2013-2014. Il s'agit de Péret Bel Air - Meymac sur la RD 76 et Beynette - Barsanges sur la RD 123.

Indicateurs de résultats :


- 20,15 km de linéaire prévu en analyse sur 2013-2014

Bilan et perspectives :

Cette action initiée par la Chambre d'agriculture et le CG19 a montré son efficacité sur les itinéraires suivants Gourdon-Murat Lestards (sur le PNR) et Valiergues / Lamazière basse - Palisse (en dehors du PNR). Le PNR apporte son expertise paysagère et environnementale sur le territoire du PNR.

Action CFT	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Diagnostic global et animation	CG19	en cours	0 €	32 500 €	40 % FEDER 60 % CG19

Cette action trouverait un intérêt à être systématique sur les routes départementales et à être engagée sur les autres départements.

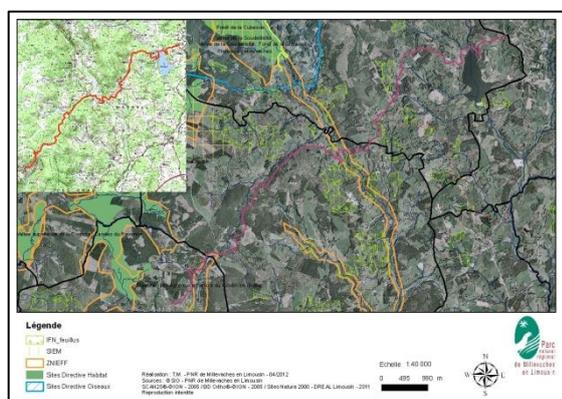

Carte des sensibilités écologiques sur une départementale



Marquage arbres / écologiques sur Gourdon-Murat réalisé en partenariat avec la chambre d'agriculture 19

OBJECTIF 2 – Accompagner les entreprises de travaux forestiers

Action I.3. Rencontrer les entreprises de travaux forestiers

Réalisation :

- animation de l'EDT auprès des ETF

Indicateurs de résultats :

- tous les ETF contactés (63 dénombrés liste EDT)
- évolution du nombre d'ETF adhérant à l'EDT sur le territoire : 4 ETF ont adhéré depuis 2011.
- information et sensibilisation des ETF suivant les parutions de nouveaux décrets (ex Hygiène et Sécurité) ou demande des adhérents

Bilan et perspectives :

L'animation de l'EDT suit son cours. Peu d'ETF du territoire ont adhéré à l'EDT.

Action I.4. Proposer des formations aux entreprises de travaux forestiers

Réalisations :

- Réalisation du programme de formation à destination des entreprises de travaux forestiers
- Mise en place pérenne d'une formation sur les franchissements de cours d'eau par le CFPPA

Indicateurs de résultats :

<u>Intitulé de la journée de formation</u>	<u>Nombre de journées</u>	<u>Date</u>	<u>Nombre de participants</u>	<u>Nombre d'entreprises</u>	<u>Intervenants</u>
Franchissement de cours d'eau	½	09.12.11	7	3	CFPPA/ONEMA/PNR
Régénération naturelle en peuplements feuillus	½	26.10.12	9	3	CRPF/CFPPA/FCBA/Unisylva
Régénération naturelle en peuplements résineux	½	28.09.12	9	5	CRPF/CFPPA/FCBA/Unisylva
Franchissement de cours d'eau (fonds VIVEA/FAFSEA)	3	16.05.12 24.04.13 17.05.13	16 17 9	6 13 8	CFPPA/ONEMA/DDT19/PNR/ CC Gorges de la Haute Dordogne

Bilan et perspectives :

Le travail en partenariat avec le CFPPA a permis d'initier et de prolonger les formations sur les franchissements de cours d'eau qui trouvent comme source de financement le fond VIVEA (ou FAFSEA suivant le type de demande). Au vu de ce résultat, il semble préférable de mutualiser les formations touchant les ETF avec le CFPPA et d'orienter les efforts financiers de la charte forestière sur d'autres thématiques.

Actions	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
3 ½ journées de Formation ETF	PNR	réalisé	4 800 €	3 350 €	80 % Région 20 % PNR
3 journées « franchissements » formation ETF	CFPPA	réalisé	0 €	3 200 €	100 % VIVEA/FAFSEA /OPCA3+



Discussion sur un cas concret d'exploitation à l'occasion de la journée du 16 mai 2012



Présentation réalisée en partenariat avec la CC Gorges de la Haute Dordogne et le CFPPA sur les franchissements de cours d'eau

OBJECTIF 3 – Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts

Action I.5. Mettre en place une gestion forestière durable prenant en compte les enjeux ornithologiques sur un secteur expérimental

Réalisations :

- rédaction d'un cahier des charges et mise en œuvre de la procédure de marché public pour le recrutement de prestataires
- réalisation d'une cartographie de l'occupation forestière sur 18 841 ha (prestataire Cabinet RIBOULET)
- réalisation du diagnostic du périmètre d'étude par le PNR
- lancement de l'animation dès octobre 2012 (prestataire CRPF) pour une durée de 20 mois, fin mai 2014
- mise en place d'outils de communication (site internet du PNR, CRPF, article publié dans les lettres d'information des sites Natura 2000 de Forêt de la Cubesse, des Landes et zones humides de la Haute-Vézère, bulletins municipaux de Meymac...)
- mise en place de conventions morales avec les propriétaires et le PNR sur le maintien d'arbres à cavités
- inventaire complémentaire d'arbres à loges et de nids de rapaces réalisé le 5 mars 2013 en partenariat avec le BTS de Neuvic, 60 élèves GPN ont participé (reproduction de la démarche à l'étude)

Indicateurs de résultats (renseigné après 10 mois d'animation):

- marquage conservatoire d'arbres à loges : 15 propriétés en cours de conventionnement 8 conventions signées représentant 57 arbres à loges / 0 ilot de vieillissement
- 20 propriétaires ont bénéficié d'une visite conseil
- 77,4 ha de travaux envisagés, le tableau récapitulatif est présenté ci-dessous :


	Plantation	Irrégularisation	Travaux Sylvicoles	Eclaircies résineuses	Amélioration feuillue	TOTAL
Surface (en ha)	8,7	8,4	2,3	31	27	77,4 ha
Dispositif ADELI				5 dossiers pour 19 ha	5 dossiers pour 27 ha	46 ha
Dispositif OPAFE	2 dossiers pour 2,2 ha	1 dossier de 4 ha				6,2 ha

Bilan et perspectives :


L'animation reste récente, le bilan est donc provisoire. Cette action innovante devrait être efficace pour amener de nouveaux propriétaires à une gestion forestière intégrant les enjeux de mobilisation et de préservation des populations de chouette de Tengmalm.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Etude cartographique	PNR	Réalisé	10 000 €	8539.44 €	40 % Région / 40% FEADER / 20% PNR
Animation de 20 mois	PNR	en cours	120 000 €	108 848.9 €	40 % Région / 40% FEADER / 20% PNR


Cette action est à poursuivre pour en apprécier la réussite.

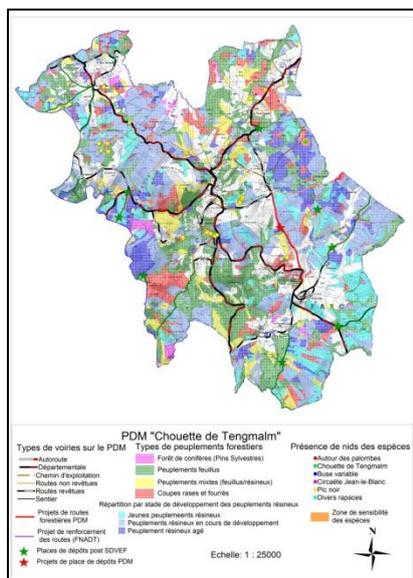

Exemple de support cartographique utilisé à l'échelle d'une commune



Couverture convention type « maintien d'arbres à cavités »




Dessin de la Chouette de Tengmalm réalisé par Marc GIRAUD

II. Bilan de l'enjeu II

II.1. Bilan général de l'enjeu II

	Impact	Résultat	Réalisation
ENJEU II - VALORISER LOCALEMENT NOTRE RESSOURCE ET DEFENDRE UNE IMAGE DE QUALITE	Partiel		
OBJECTIF 1 – Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource		Faible	
Action II.1. Faire émerger des initiatives collectives au sein des petites entreprises de la filière bois			Faible
OBJECTIF 2 – Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises		Faible	
Action II.2. Communiquer sur les entreprises et leur savoir faire			Faible
Action II.3. Marquer « Parc » des produits et savoir-faire bois			Faible
Action II.4. Inciter à la création d'une gamme de mobilier en essences locales			Faible
Action II.5. Accompagner les projets de recherche appliquée sur le territoire			Abandon
OBJECTIF 3 – Promouvoir une construction bois intégrée au paysage et issue de circuits courts		Bon	
Action II.6. Lancer un appel à projet pour l'extension bois de bâtis anciens communaux			Bonne
Action II.7. Sensibiliser à l'utilisation du bois dans la construction			Bonne

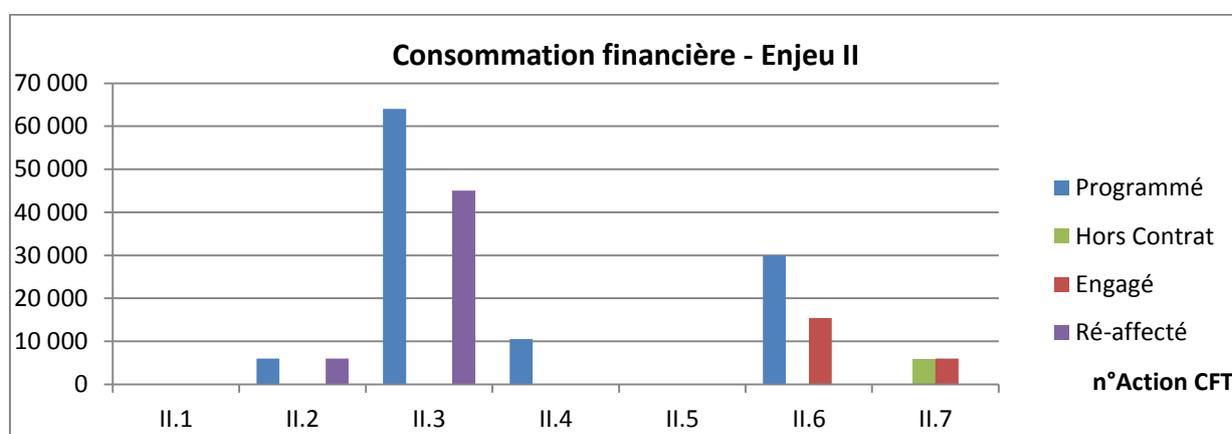

	2011	2012	2013
Animation prévue dans la CFT	15%	69%	40%
Animation effectuée	1%	5%	1%

II.2. Bilan détaillé de l'enjeu II par actions

OBJECTIF 1 – Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource

Action II.1. Faire émerger des initiatives collectives au sein des petites entreprises de la filière bois

Réalisations :

- Quelques rencontres effectuées auprès des entreprises depuis 2012 et 2013 avec BoisLim

Indicateurs de résultats :

- 10 rencontres réalisées par BoisLim dont deux mutualisées avec le PNR auprès des entreprises de 2^{nde} transformation
- aucune proposition d'approche collective

Bilan et perspectives :

BOISLIM rencontre des entreprises « construction bois » à l'échelle du Limousin. Ces rencontres ont permis d'améliorer la connaissance des savoir-faire locaux sur le territoire du PNR. Toutefois, le besoin en animation est important pour avancer sur cette action et être force de propositions. Elle est en lien directe avec l'action II.3 (marquage produits bois) et II.6. (projet sur la construction bois).

Aucun financement n'a été ciblé sur cette action.

OBJECTIF 2 – Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises

Action II.2. Communiquer sur les entreprises et leur savoir faire

Réalisations :

- Référencement des entreprises réalisé mais non réactualisé depuis 2009
- Aucune autre réalisation

Indicateurs de résultats :

- aucun

Bilan et perspectives :

Cette action n'a pu être menée faute de temps d'animation.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Réalisation catalogue savoir-faire	PNR	non réalisé	6 000 €	0 €	50 % Région 50 % PNR

Des liens sont à rechercher avec BoisLim, la CCI et la CMA.

Action II.3. Marquer « Parc » des produits et savoir-faire bois

Réalisations :

- Aucune réalisation

Indicateurs de résultats :

- aucun

Bilan et perspectives :

Cette action n'a pas été poursuivie. L'animation n'a pas été suffisante pour entamer le travail sur cette thématique, la chargée de mission marquage Parc n'a pas non plus pu dégager le temps suffisant à la poursuite de cette action. L'animation reste le facteur bloquant pour la mise en œuvre de cette action très chronophage. Les crédits ont été ré-affectés au volet forestier du dispositif OPAFE (action IV.2).

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Etude sur la stratégie de marquage	PNR	abandon	45 000 € ré-affecté	0 €	50 % Région 50 % PNR

Action II.4. Inciter à la création d'une gamme de mobilier en essences locales

Réalisations :

- règlement et cahier des charges rédigés

Indicateurs de résultats :

- lancement du concours non réalisé

Bilan et perspectives :

Cette action n'a pu être menée faute de temps d'animation.

Bilan financier détaillé :

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Concours design mobilier bois	PNR	non réalisé	10 500 €	0 €	50 % Région 50% PNR

OBJECTIF 3 – Promouvoir une construction bois intégrée au paysage et issue de circuits courts

Action II.6. Lancer un appel à projet pour l'extension bois de bâtis anciens communaux

Réalisations :

- constitution d'un groupe tripartite FNCOFOR, APIB et PNRML d'accompagnement de projet construction bois
- réalisation de la méthodologie sur un MO test

Indicateurs de résultats :


- méthodologie testée
- accompagnement d'un projet
- d'autres sont en cours
- cahier des charges pour un futur AAP rédigé

Bilan et perspectives :

Cette action a été difficile à monter en terme de méthodologie. Mais le test réalisé sur le projet de réhabilitation de la communauté de communes des Portes de Vassivière a démontré l'intérêt de cette action.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Accompagnement étude architectural – bois construction	Collectivité	réalisé (1 projet)	30 000 €	15 390.26 €	40 % Région 60% collectivité

Les liens avec les autres dispositifs existants sont essentiels (CEP, 100 construction bois, AAP régional...). Cette action nécessiterait une plus grande envergure en termes d'accompagnement et de porter à connaissance auprès des élus. L'enveloppe actuelle ne permet plus l'AAP.

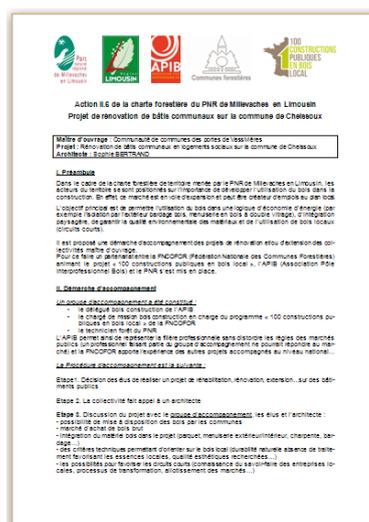

Projet conduit par l'architecte Sophie BERTRAND / Note d'accompagnement destiné à l'architecte et maître d'ouvrage

Action II.7. Sensibiliser à l'utilisation du bois dans la construction

Réalisations :

- 2 journées de sensibilisation réalisées avec l'URCOFOR (le 22.05.10, 10.10.13)

Indicateurs de résultats :

- Interventions d'architectes lors des journées
- Taux de participation 1^{ère} journée 13 pers. dont 7 élus ;
- 2^{ème} journée reportée du fait faible nombre d'élus inscrits

Bilan et perspectives :

Cette action est à poursuivre en synergie avec l'action précédente.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Journées de sensibilisation	URCOFOR	réalisé	0 €	6 000 €	50% FEADER 50 % URCOFOR




Visite du centre d'Hestia à Saint -Setiers (remerciements à la Fondation Jacques CHIRAC et l'architecte VARIERAS)

III. Bilan de l'enjeu III

III.1. Bilan général de l'enjeu III

	Impact	Résultat	Réalisation
ENJEU III - DEVELOPPER LA FILIERE BOIS-ENERGIE LOCALE AU TRAVERS DE LA PLAQUETTE FORESTIERE	Bon		
OBJECTIF 1 – Augmenter la part des collectivités et particuliers alimentés en bois énergie		Bon	
Action III.1. Accentuer la communication auprès des élus			Bonne
OBJECTIF 2 – Mettre en place un approvisionnement local et durable en plaquettes forestières		Partiel	
Action III.2. Réaliser un « Plan d'Approvisionnement Territorial » à l'échelle du PNR			Bonne

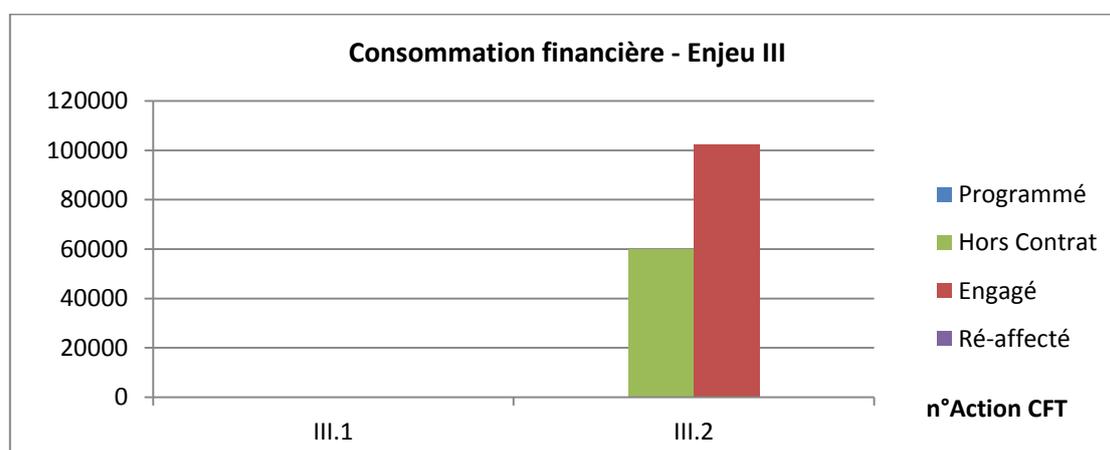

	2011	2012	2013
Animation prévue dans la CFT	5%	3%	3%
Animation effectuée	9%	3%	2%

III.2. Bilan détaillé de l'enjeu III par actions

OBJECTIF 1 – Augmenter la part des collectivités et particuliers alimentés en bois énergie

Action III.1. Accentuer la communication auprès des élus

Réalisations :

- Actions en lien direct avec le Conseil en Energie Partagé
- Rencontre des conseils municipaux

Indicateurs de résultats :

- Adhésion de 13 communes / diagnostic énergétique
- Journée auprès des élus

Bilan et perspectives :

Cette action suit son cours grâce au CEP. Elle prend la forme de conseil direct, rencontre avec les collectivités, journées d'échanges et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage.

Bilan financier détaillé : aucun financement ciblé sur cette action

OBJECTIF 2 – Mettre en place un approvisionnement local et durable en plaquettes forestières
--

Action III.2. Réaliser un « Plan d'Approvisionnement Territorial » à l'échelle du PNR

Réalisations :

- PAT bois énergie réalisé
- PAT bois d'œuvre testé
- Test d'une approche IBP

Indicateurs de résultats :

- rendu étude
- document de communication
- Réflexion amorcée sur le POST-PAT
- accompagnement CEP renforcé par le PAT

Bilan et perspectives :

Le PAT a été réalisé. Le PAT bois énergie bois d'œuvre fournit aux acteurs du territoire un outil territorial de réflexion. Le partenariat avec la communauté de communes de Bourgneuf-Royère a


Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
PAT BOBIBE	URCOFOR	réalisé	0 €	102 428.55 €	80% CIMAC + forfait territoire

été réussi. La poursuite du POST-PAT est essentielle pour profiter de l'outil PAT.

IV. Bilan de l'enjeu IV

IV.1. Bilan général de l'enjeu IV

	Impact	Résultat	Réalisation
ENJEU IV - INTEGRER DURABLEMENT LA FORET DU TERRITOIRE DANS UN CADRE ECONOMIQUE, PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL DE QUALITE	Partiel		
OBJECTIF 1 – Accompagner la gestion sylvicole des peuplements		Bon	
Action IV.1. Renouveler les peuplements et maintenir le potentiel de production			Partielle
Action IV.2. Développer des alternatives de gestion forestière			Bonne
OBJECTIF 2 – Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques		Faible	
Action IV.3. Accompagner l'exploitation et la gestion forestière le long de cours d'eau			Faible
Action IV.4. Accompagner le franchissement de cours d'eau			Partielle
OBJECTIF 3 – Améliorer notre connaissance du territoire et les possibilités sylvicoles qui s'offrent à nous		Faible	
Action IV.5. « Sylviculture et changements climatiques »			Abandon
Action IV.6. Mettre en place un outil d'aide à la décision pour tendre à l'équilibre sylvo-cynégétique			Abandon
OBJECTIF 4 – Développer l'accueil du public en forêt		Bon	
Action IV.7. Réaliser des aménagements sur les forêts à forte valeur patrimoniale			Bonne

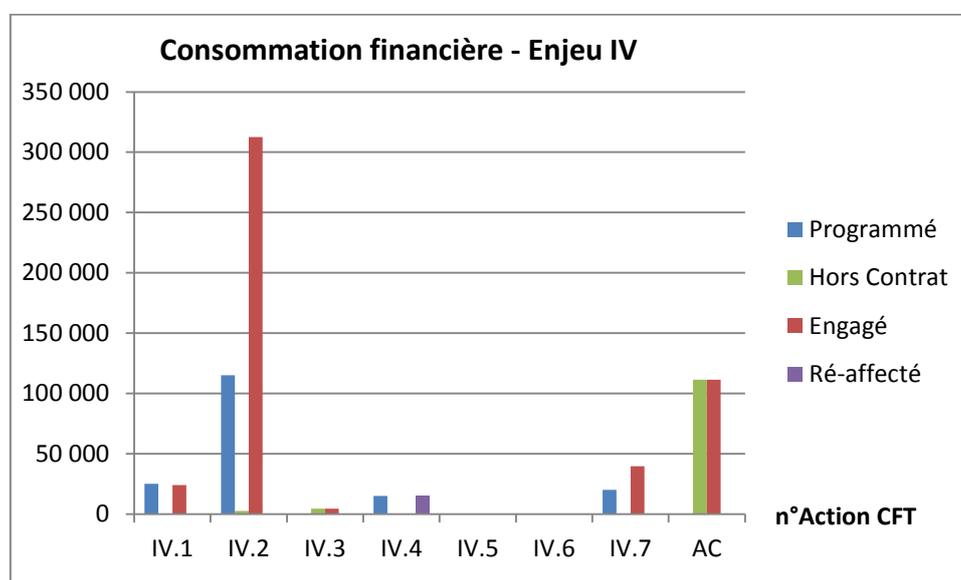

	2011	2012	2013
Animation prévue dans la CFT	34%	43%	46%
Animation effectuée	27%	43%	41%

IV.2. Bilan détaillé de l'enjeu IV

OBJECTIF 1 – Accompagner la gestion sylvicole des peuplements

Action IV.1. Renouveler les peuplements et maintenir le potentiel de production

Réalisations :

- Acquisition de micro-parcelles : mise en place d'une mesure d'accompagnement financier intégrée au dispositif OPAFE
- Echange amiable : mise en place d'une animation SAFER ciblée sur le PNR intégrée au dispositif OPAFE;

Indicateurs de résultats :

- Surface forestière échangée : 36ha75 pour 16 dossiers dont 13 dossiers mixtes agricole / forêt
- Surface d'acquisition de micro-parcelle forestière : 13 dossiers constitués pour 11ha86, 6 ha 37 pour 9 dossiers réalisés.

Bilan et perspectives :

Cette action fonctionne mais reste anecdotique ; la question du cout et de la pérennité de cette action à moyen terme peut être posée. Pour avoir un réel impact, cette action devra être complétée : action innovante sur la réduction du morcellement (regroupement de chantier, mise en commun de vente de bois sur pieds...), voir sectorisée.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Acquisition parcelles (frais actes notariés)	Propriétaires forestiers	réalisé	10 000 €	6 916.10 €	45 % Région 55 % demandeur
Animation échange amiable	PNR	réalisé	40 000 €	32 000 €	80 % Région 20% PNR

Action IV.2. Développer des alternatives de gestion forestière

Réalisations :

- Etude sur la régénération naturelle en forêt de production résineuse (rapport d'étude, 200 placettes temporaires sur un périmètre de 115 000 ha)
- Mise en place accompagnement technique financier de régénération naturelle, irrégularisation et reboisement diversifié (intégré dans le dispositif OPAFE)
- Recherche actuelle de parcelles intéressantes pour la mise en place d'un martélescope (en partenariat avec l'école forestière et le CRPF) et de placettes AFI

Indicateurs de résultats :

- Rendu étude régénération naturelle
- Dispositif d'aide ouvert sur la gestion forestière (régénération naturelle, diversification, irrégularisation)

Bilan et perspectives :

Le dispositif OPAFE est une réussite il a permis d'accompagner près de 200 ha de chantiers sylvicoles sur le PNR avec plus de 220 000 € de travaux aidés par la Région.

Des réflexions sont à mener afin d'améliorer l'animation de ce dispositif qui nécessite un animateur dédié. Des pistes pourraient être étudiées pour étendre ce dispositif sur la communauté de communes de Bourganeuf-Royère (pour partie sur le PNR) et au périmètre du contrat Territorial Chavanon en lien avec l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Etude sur la régénération naturelle	PNR	réalisé	0	2 500 €	100 % PNR
Dispositif aide OPAFE	Propriétaires forestiers	réalisé	90 000 €	308 537 €	~36% Région
Communication dispositif OPAFE	PNR	réalisé	3 000 €	1500 €	45% Région 55 % PNR
Installation martéloscope et placettes AFI	PNR	en cours	22 000 €	0 €	80% Région 20% PNR

OBJECTIF 2 – Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

Action IV.3. Accompagner l'exploitation et la gestion forestière le long de cours d'eau

Réalisations :

- Aucun chantier test réalisé : prévu dans le cadre du CTVA
- Réalisation d'un carnet technique sur l'eau et la forêt avec le Contrat Territorial du Chavanon

Indicateurs de résultats :

- aucun

Bilan et perspectives :

Aucun financement n'a été ciblé sur cette action. Le volet eau de la charte forestière pourra s'intégrer dans le dispositif OPAFE avec peut être une déclinaison sur le Chavanon (voir action IV.2.).

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Chantier test sylvicoles sur le CTVA	PNR	non réalisé	0 €	0 €	40 % Agence Loire-Bretagne 20% Région
Carnet technique	PNR	réalisé	0 €	4 300 €	20 % Région 80% PNR

Action IV.4. Accompagner le franchissement de cours d'eau

Réalisations :

- mise à disposition de kits de franchissement sur le territoire du PNR
- transfert du protocole et prêt de matériel au Pays de Guéret et Communauté de communes de Bourgneuf-Royère
- réalisation d'un projet de fin d'étude à l'IUT Génie Civil d'Egletons : sur un modèle de franchissement permanent en bois Douglas

Indicateurs de résultats :

- nombre d'emprunts : 5 depuis 2009
- aucune perte ou dégradations de tuyaux
- pas de modèle permanent réalisé

Bilan et perspectives :

Le nombre de prêt reste très faible. Mais cette action a permis de sensibiliser les opérateurs sur ce type de matériels qui est peu onéreux. Le transfert de cette méthodologie au Pays de Guéret et à la Communauté de communes de Bourgneuf-Royère.

Une réflexion, avec le CFPPA, sur le prêt de rampes métalliques est en cours afin de faire découvrir ce type d'équipement complémentaire des tuyaux PEHD.

L'action programmée sur les franchissements permanents en bois reste inachevée.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Conception de pont en bois	PNR	en cours	15 000 €	0 €	20% Europe 25% Région
Installation de pont en bois	Collectivités	non réalisé	0 €	0 €	?

OBJECTIF 3 – Améliorer notre connaissance du territoire et les possibilités sylvicoles qui s'offrent à nous

Action IV.5. « Sylviculture et changements climatiques » : abandon

Action IV.6. Mettre en place un outil d'aide à la décision pour tendre à l'équilibre sylvo-cynégétique : abandon

Ces deux actions n'ont pas été retenues dans l'arbitrage budgétaire du contrat Parc 2011-2013.

OBJECTIF 4 – Développer l'accueil du public en forêt

Action IV.7. Réaliser des aménagements sur les forêts à forte valeur patrimoniale

Réalisations :

- aménagement Puy de Tourte (MO : commune de Soudeilles)
- restauration arboretum de Saint-Pardoux-le-Vieux (MO commune de Saint-Pardoux le Vieux)
- ré-aménagement du saut de la Virolle (MO Communauté de communes de Bugeat-Sornac)
- de nombreux projets sont en cours de réflexion ou de réalisation (Douglas des Farges, Forêt de Mirambel, Massif des Agriers...)

Indicateurs de résultats :

- 3 sites valorisés et une diversité des aménagements

Bilan et perspectives :

A rechercher les déclinaisons dans les volets touristes

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Aménagements	Communes	réalisé	20 000 €	39 462 €	40% Europe ; 30 % Région / 30% communes



Extrait du projet d'aménagement sur la commune de Soudeilles



Panneau d'accueil de l'arboretum de l'école primaire de Saint-Pardoux-le-Vieux

Action IV.8. < Réalisation d'un film pédagogique et interactif sous forme d'une promenade virtuelle sur les enjeux de préservation et de multifonctionnalité forestière >

Contexte :

Ce projet est issu des chartes forestières du Morvan et de Millevaches. Nos deux territoires avaient la volonté d'aborder différemment la multifonctionnalité de la forêt sous un angle plus accessible auprès du grand public. Il a été proposé la « réalisation d'un film pédagogique et interactif sous forme d'une promenade virtuelle sur les enjeux de préservation et de multifonctionnalité forestière ». Les similitudes des deux territoires et des problématiques proches ont permis de construire ce projet.

Cette action a été proposée à l'occasion du 2^{ème} appel à projet à destination des parcs naturels régionaux lancé en début d'année 2011 par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et retenu parmi 11 autres lauréats. Un financement de 93 000 € a ainsi été obtenu, **financement à hauteur de 100%** avec comme maître d'ouvrage et territoire pilote le PBR du Morvan et le PNR de Millevaches comme territoire associé.

Réalisations :

- DVD édité par Harmattan video, intégrant un film d'auteur et une balade interactive
- site internet est prévu courant 2014
- projections de lancement officiel débuteront courant 2014

Indicateurs de résultats : non prévu initialement dans la charte forestière

Bilan et perspectives :


Ce DVD ainsi que sa déclinaison en site internet pourront être de bons supports d'animation auprès des propriétaires forestiers mais aussi des acteurs de la filière. Le film d'auteur en particulier permettra de susciter le débat tout en apportant des éléments factuels. Une diffusion du DVD devra être organisée auprès des propriétaires au travers de journées de sensibilisation, d'événementiel...3000 DVD ont été édités pour chaque PNR.

Il permettra aussi de faire connaître un peu plus le territoire du PNR Millevaches par une plus large diffusion auprès de l'éditeur HARMATTAN VIDEO (réseau de diffusion : FNAC, Amazon.fr, Cultura, bibliothèques, éducation nationale).

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Réalisation d'un DVD et d'un site internet	PNR du Morvan	réalisé	0 €	93 000 €	100% MEDDTL



Couverture provisoire du DVD – sortie prévue en Février 2014

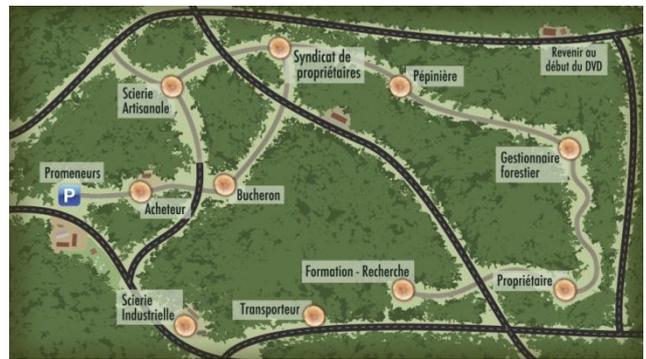


Menu de navigation au sein du DVD

V. Bilan de l'enjeu V

V.1. Bilan général de l'enjeu V

	Impact	Résultat	Réalisation
ENJEU V - ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LA CHARTE FORESTIERE	Bon		
Action V.1. Mettre en place un programme de formation pluri-annuel sur la forêt			Bonne
Action V.2. Animer et mettre en œuvre la Charte forestière de territoire			Bonne

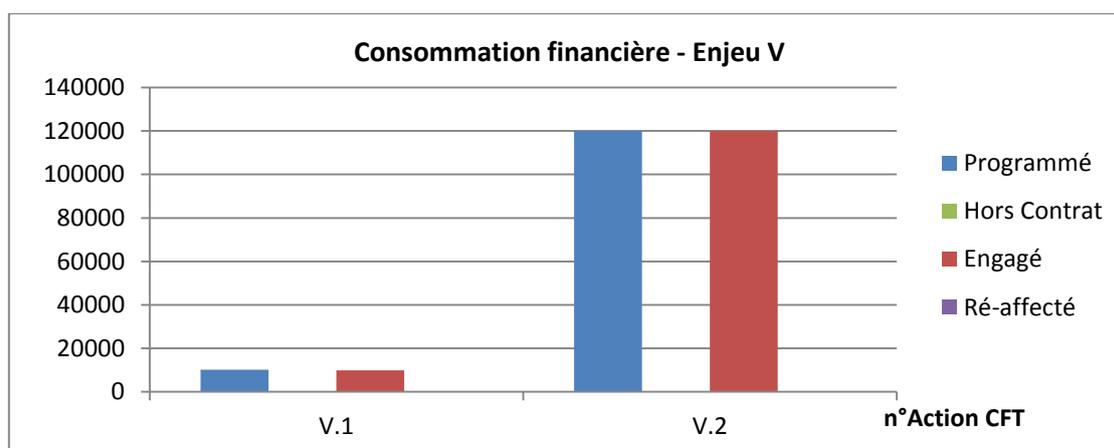

	2011	2012	2013
Animation prévue dans la CFT	5%	3%	3%
Animation effectuée	8%	7%	3%

Animation Enjeu V hors animation courante à la CFT.

V.2. Bilan détaillé de l'enjeu V par actions

Action V.1. Mettre en place un programme de formation pluri-annuel sur la forêt

Réalisations :

- mise en place d'un programme de formation. Les journées concernant les entreprises de travaux forestiers ont été présentées dans l'action I.4.
- mise en ligne du support pédagogique sur le site internet du PNR (articles de presse ont été réalisés)

Indicateurs de résultats :

<u>Intitulé de la journée de formation</u>	<u>Nombre de journées</u>	<u>Nombre de participants</u>	<u>Nombre de propriétaires</u>	<u>Nombre de gestionnaires</u>	<u>Intervenants</u>
Boisements mixtes et mélangés	1	29	19	4	CRPF/Ecole forestière
Régénération naturelle en peuplements feuillus	1	12	6	3	CRPF/Hans KREUSSLER
Régénération naturelle en peuplements résineux	1	22	18	1	CRPF/CFPPA/Ecole forestière
La gestion irrégulière d'un peuplement forestier	2	7	6	1	C2FP/Cabinet Coudert
A la découverte d'un martéloscope – outil d'aide à la gestion forestière	Non réalisée				

Bilan et perspectives :

La participation est satisfaisante, mais la mise en place des journées reste lourde en termes de montage administratif et limite le choix de l'opérateur (12j/an montage du dossier et organisations des journées). C'est pourquoi, cette action devrait être ouverte aux structures actives ne pouvant prétendre aux fonds VIVEA, FAFSEA ou FEADER mes.111. Elle pourrait être ouverte aux associations de type GDFs, CENL, Nature sur un Plateau... et ponctuellement le PNR.

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Journées de formation	PNR	réalisé	10 200 €	9 900 €	80% Région 20% PNR



Présentation du CRPF sur la journée « boisements mélangés » à l'école forestière de Meymac



Visite de parcelles en boisements mélangés

Action V.2. Animer et mettre en œuvre la Charte forestière de territoire

Réalisations :

- actions de la charte forestière mise en œuvre pour la plupart voir bilan
- réponse à deux appels à projets dont un fructueux :
 - o projet stratégie nationale pour la biodiversité (avril 2012), en partenariat avec PNR Périgord Limousin, CRPF Limousin et IDF : non retenu
 - o film interactif sur la forêt (juin 2011), en partenariat avec le PNR du Morvan : retenu
- suivi et conseil en marquage FSC
- communications diverses (journal du GDF, forêt limousine, journal du PNR), participation à des manifestations soit au travers d'interventions, tenu de stand (VIème forestière, festival Eho-liens, Bistrot d'hiver, journée annuelle du syndicat des propriétaires forestiers...)
- nouvelles actions nées de l'animation (film en partenariat avec le PNR du Morvan, projet OPTIQ-BIODIV en cours avec la communauté de communes du Plateau de Gentioux)

Indicateurs de résultats :

- voir bilan


Bilan et perspectives :

L'animation de la charte forestière pour être efficiente nécessite d'être augmentée. Presque 30% de l'animation est nécessaire au fonctionnement de la charte forestière (réunion, bilan, demande de financement, groupe de travail, copil...).

Action	MO	Etat d'avancement de l'action	Enveloppe CP	Estimation des dépenses	Financement
Animation charte forestière 2011-2013	PNR	réalisé	120 000 €	120 000 €	40% FEADER / 40% Région / 20 % PNR

VI. Indicateurs de suivi global de la charte


VI.1. Nature et volume des aides engagées

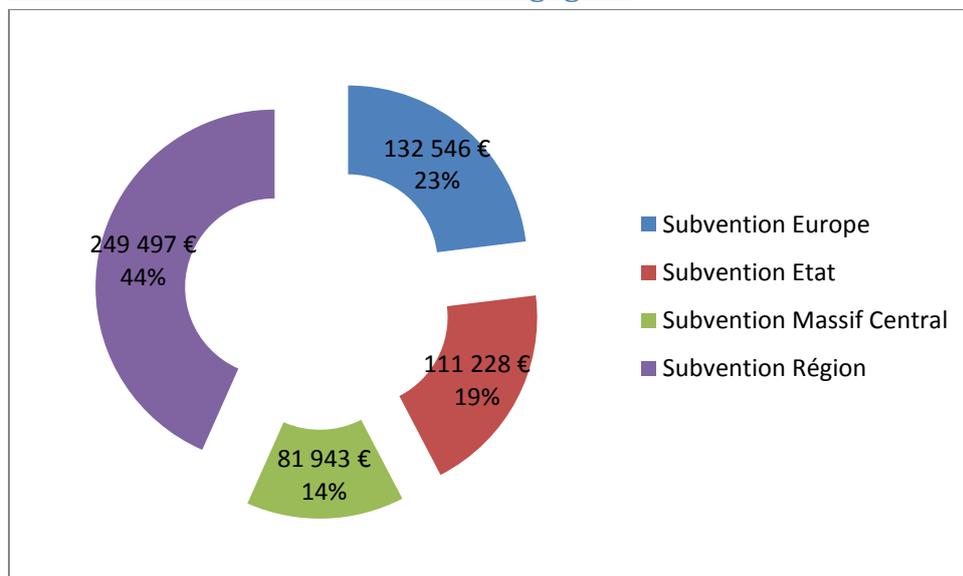

Bilan :

- 572 213 € soit un peu plus de 190 000 €/an d'aide engagée
- principal soutien la Région Limousin
- Importance de réserver du temps d'animation pour répondre aux appels à projets pouvant répondre aux objectifs de la charte forestière (appels du MEDAT représente la totalité de l'aide reçue par l'ETAT)


VI.2. Volume d'actions engagées suivant la nature du maître d'ouvrage

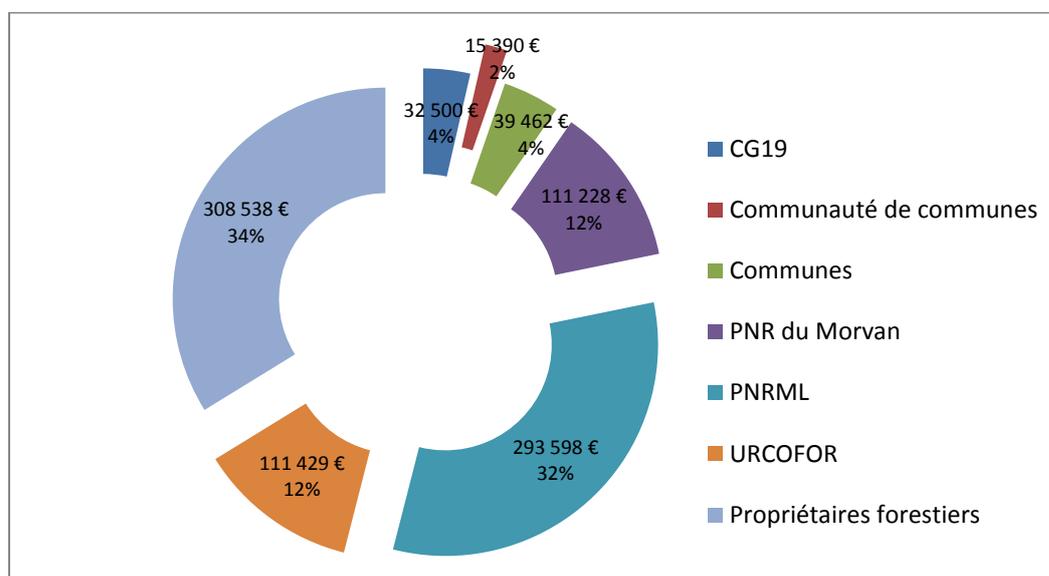

Bilan :

- seul le CG19 s'est engagé sur la charte forestière
- exceptée l'URCOFOR, les associations ne sont pas impliquées ou n'ont pas bénéficié de la charte forestière
- le PNRML garde une part importante de la maîtrise d'ouvrage (dont l'animation de la charte forestière)
- le volet forestier du dispositif OPAGE portant sur la gestion forestière a permis d'engager une enveloppe importante en volume d'actions avec plus de 300 000 € soit 100 000 €/an.
- peu de partenaires prenant la MO (tels que le CRPF, l'ONF, les associations...)


VI.3. Volume d'actions engagées par enjeu

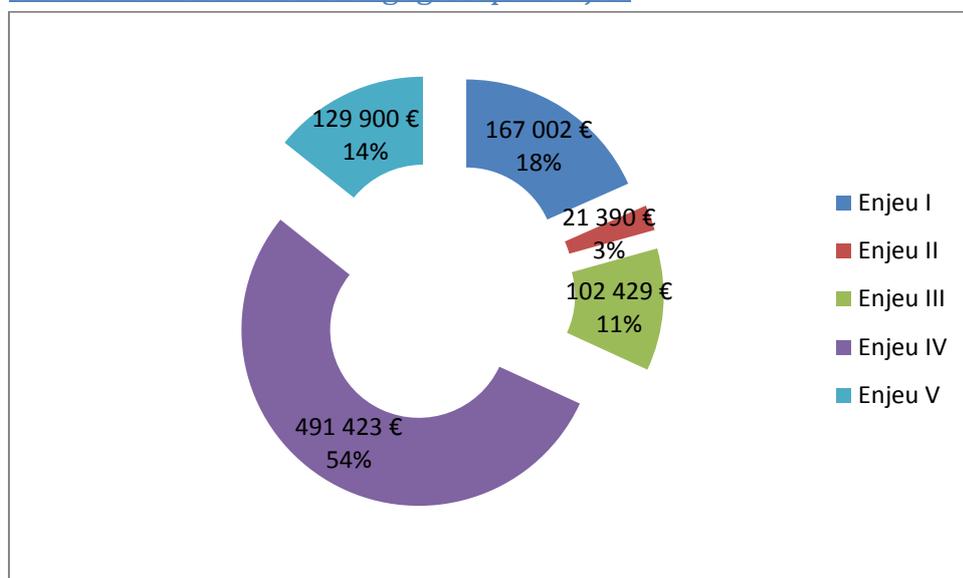

Bilan :

- l'amont de la filière bois a été largement impacté par la charte correspondant à l'enjeu I (mobilisation) et IV (gestion, multifonctionnalité)
- l'aval de la filière a été très peu impacté moins de 4% des aides allouées pour la partie construction bois, 15% bois énergie qui correspond uniquement à l'outil PAT.


VI.6. Répartition de l'animation par enjeu (2011 -2012)

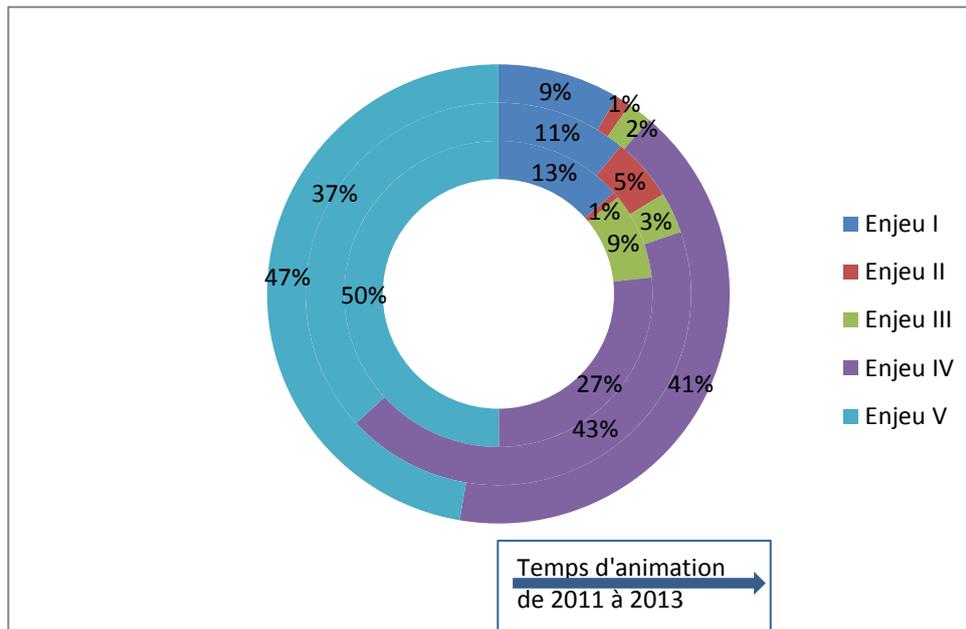

Bilan :

- L'enjeu I est principalement concerné par le PDM chouette de Tengmalm débuté fin 2012, le montage technique et financier a été important. Il devrait représenter sensiblement la même charge d'animation en 2013 (coordination et suivi de l'animation du CRPF)
- L'enjeu II correspond presque essentiellement à la partie bois construction avec l'accompagnement du projet sur Cheissoux en 2012.
- L'enjeu III est représenté uniquement par le PAT, avec en 2011 la réalisation du PAT, 2012 la validation des résultats et enfin 2013 la préfiguration du POST-PAT.
- Le temps d'animation consacré à l'enjeu IV est croissant ; la forte augmentation constatée, presque de 20%, correspond à l'animation du volet forestier du dispositif OPAFE qui a débuté fin 2011.
- L'enjeu V concerne l'animation de la charte (organisation des groupe de travail, comité de pilotage, bilan, réunions partenaires...), chaque année environ 10% sont toutefois à allouer au programme de formation réparti sur 2011-2013.


VI.7. Synthèse des enveloppes

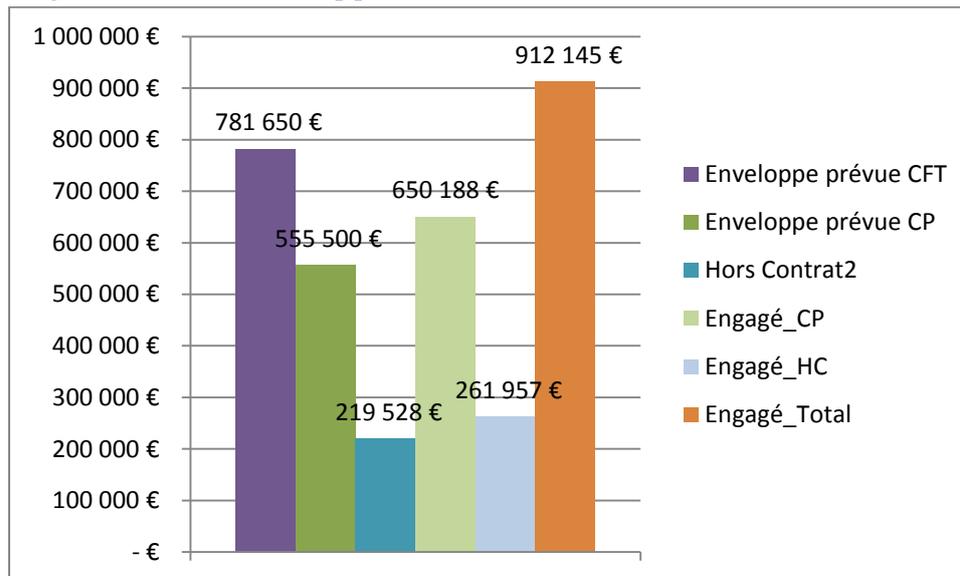

Bilan :

- taux de consommation important de la CFT 73.4 % (hors volet forestier du dispositif OPAFE) et monte à 117% avec le volet forestier OPAFE (qui a bénéficié de nombreux crédits réaffectés)
- 117% des financements programmés dans la charte forestière ont été consommés (enveloppe prévue dans le cadre du contrat Parc 2011-2013 + enveloppe hors contrat Parc)

VI.8. Participation au comité de pilotage

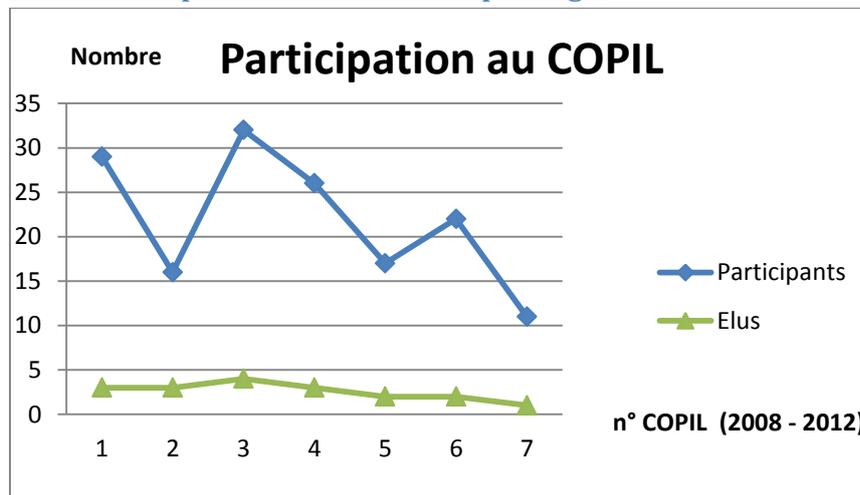

Bilan :

- 1 à 2 copil par an
- le nombre de participants tend à décroître
- le nombre d'élus présents reste faible
